

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vranovice – sportoviště II

Číslo smlouvy: 2022-09-14

Článek I. - Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název:	Obec Vranovice
Sídlo:	Školní 1, 691 25 Vranovice
IČ:	00283720
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Šárkou Novotnou – starostkou obce
Zastoupený ve věcech technických:	Leošem Pekárkem - TDI
Bankovní spojení (1):	1382190309/0800, Česká spořitelna, a. s.

2. ZHOTOVITEL:

Název:	PROSTAVBY, a. s.
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ:	27713130
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Viktor Svoboda, předseda představenstva
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.; č.ú.:258746889/0300
Hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Janský
Zástupce stavbyvedoucího:	Ing. Marek Kolář

Preambule:

Tento dodatek k SOD je vyvolán zejména nutností řešit změny stavby, které nebylo možné předvídat a změny, které řeší zjednodušení některých konstrukcí s cílem kompenzovat nárůst nákladů na řešení uvedených nepředvídatelných změn.

Dle charakteru předmětných změn je možné rozsah změn řešit za podmínky dodržení pravidel daných § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Změny projektu je možné charakterizovat jako změny, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původního závazku

u změn dle odst. č. 4 a 5 § 222 a nepředvídatelné změny dle odst. č 6 § 222 Zákona s limitem v součtu změn do 30% původní ceny.

Uvedené změny včetně vynucené změny termínu realizace jsou charakteru odpovídajícího ustanovení § 222, odst. 4, 5 a 6 zákona 134/2016 Sb. v platném znění. Práce obsažené v tomto dodatku jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Předmětné změny mají vliv na změnu termínu dokončení akce, které jsou obsaženy v článku V. tohoto dodatku.

Článek III. - Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se upravuje v souladu s dokumentací změny stavby před dokončením zpracované firmou Projecticon, s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek.

Dále v souladu se změnovými listy doloženými rozdílovými rozpočty obsahujícími v položkovém členění přípočty (dodatečné práce) a odpočty (nerealizované práce).

Článek V. – Doba Plnění

Ustanovení tohoto článku se upravuje takto:

1. Termín realizace díla.

Předání a převzetí staveniště	16. 1. 2023
Zahájení stavebních prací	1.3. 2023
Dokončení díla	15.8. 2023
Předání a převzetí díla	15.8. 2023
Počátek běhu záruční lhůty	<i>dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků</i>
Vyklizení a vyčištění staveniště	<i>do 5 dnů od předání a převzetí díla</i>

Článek VII. - Cena za provedení díla

Tento článek se upravuje takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla dle původní SOD a Dodatku č.1:

Celková cena bez DPH	10.202.620,34 Kč
DPH z celkové ceny díla	2.142.550,28 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	12.345.170,62 Kč

Cena dle ZL č. 8:

Celková cena bez DPH	-121.260,00 Kč
DPH z celkové ceny díla	-25.464,60 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	-146.724,60 Kč

Cena dle ZL č. 9:

Celková cena bez DPH	255.764,96 Kč
DPH z celkové ceny díla	53.710,64 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	309.475,60 Kč

Cena dle ZL č. 10:

Celková cena bez DPH	51.060,00 Kč
DPH z celkové ceny díla	10.722,60 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	61.782,60 Kč

Cena dle ZL č. 11:

Celková cena bez DPH	60.000,00 Kč
DPH z celkové ceny díla	12.600,00 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	72.600,00 Kč

Cena dle ZL č. 12:

Celková cena bez DPH	149.550,95 Kč
DPH z celkové ceny díla	31.405,70 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	180.956,65 Kč

Celková cena dle ZL č. 8 - 12:

Celková cena bez DPH	395.115,91 Kč
DPH z celkové ceny díla	82.974,34 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	478.090,25 Kč

Cena díla celkem po změnách dle dodatku č. 2:

Celková cena bez DPH	10.597.736,25 Kč
DPH z celkové ceny díla	2.225.524,62 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	12.823.260,87 Kč

Článek XXIII. – Závěrečná ujednání

Tento článek se doplňuje o nové body č. 10 a 11:

10. Ustanovení, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají v platnosti a účinnosti i ve vztahu ke změnám obsaženým v tomto dodatku smlouvy o dílo. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 7, rozdílové položkové rozpočty s výkazem výměr a změny projektové dokumentace.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.


Ve Vranovicích dne 2.8.2023

OBEC VRANOVICE

Školní 1

691 25 VRANOVICE


okr. Brno-venkov


Bc. Šárka Novotná – starostka obce v. r.

obec Vranovice

objednatel

V Otnicích dne 2.8.2023


Ing. Jaroslav Bubla v. r.

PROSTAVBY, a. s.

zhotovitel

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: 544210817, www.prostavby.eu

DIČ: CZ27713130



*Dodatek č.2 byl schválen usnesením č.04/15
Radou obce Vranovice na 15. schůzi konané 1.8.2023.*

Příloha č. 1 dodatku k SOD- Změnové listy s rozdílovými rozpočty

Přehled změn a dodatků

Název akce:		Identifikační č. akce EDS/SMVS:	
Název veřejné zakázky:		Druh veřejné zakázky:	
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):		slavební práce	
Vranovice - sportoviště II			
Vranovice - sportoviště II			
10 234 175,70 Kč			

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (+)	Hodnota změny (\$222 odst. 4 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 4 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 5 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 5 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 6 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 6 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 7 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 7 ZVZ)
	ZL č. 1 - D.1.1.2 Miniskate, D.1.1.4 Pingpong, SO04 Pilka	1	-1 272 609,58	-	+	1 272 609,58							
	ZL č. 2 - SO03 - Umělé osvětlení	1	-8 621,40										
	ZL č. 3 - SO05 - Ostatní stavební objekty	1	-218 239,35										
	ZL č. 4 - SO06 - Tenisové kurty - změna typu povrchu	1	680 218,03										
	ZL č. 5 - SO07 - Běžecká dráha a doskočiště - změna polohy doskočiště	1	163 693,28										
	ZL č. 6 - SO07 - Běžecká dráha a doskočiště - úprava únosnosti podlaží	1	85 003,66										
	ZL č. 7 - SO07 - Běžecká dráha a doskočiště - Úprava umělé závlahy	1	539 000,00										
	ZL č. 8 - SO03 - Veřejné osvětlení	2	0,00										
	Vícepráce č. 1 - Zachytání sítě	2	-121 260,00										
	Vícepráce č. 2 - Terénní úpravy - Zemina	2	255 764,96										
	Vícepráce č. 3 - Čerpadlo závlahy	2	51 060,00										
	Vícepráce č. 4 - Zpevněné plochy	2	60 000,00										
		2	149 550,95										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
	CELKEM		363 560,55	0,00	0,00	1 462 887,58	69 018,00	0,00	599 000,00	1 677 102,00	2 835 532,13	0,00	0,00
	CELKEM (v %)		3,55%										

*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední vyplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce.

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	10 234 175,70
Dodatek č. 1	-31 555,36
Dodatek č. 2	395 115,91
Realizační cena CELKEM vč. změn	10 597 736,25

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 5 ZVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 6 ZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle § 222 odst. 5 a 6 ZVZ (ve smyslu ust. § 222 odst. 9)
14,97%	5,85%	44,09%	17,17%

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: 54421081, www.prostavby.eu

DIC: CZ27713130

Verze dokumentu: 1.02

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022-09-14 Vranovice - sportoviště II

Přehled ZL č. 8-12

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: 00283720

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			269 790,88
PSV			65 325,03
MON			60 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			395 115,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	395 115,91 CZK
Základní DPH	21 %	82 974,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 478 090,25 CZK

v

OTNICE

dne

2.8. 2023

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: 544210817, www.prostavby.eu

DIČ: CZ27713130 ②

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE

Školní 1

691 25 VRANOVICE

okr. Brno-venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vranovice - sportoviště II	0,00	395 115,91	82 974,34	478 090,25	100
30	ZL č.9 - Záchytné sítě za brankou u kabin	0,00	255 764,96	53 710,64	309 475,60	65
31	ZL č.10 - Teréní úpravy kolem hřiště	0,00	51 060,00	10 722,60	61 782,60	13
32	ZL č.11 - D+M čerpadlo závlahy ve studni	0,00	60 000,00	12 600,00	72 600,00	15
33	ZL č.12 - Zpevněné plochy	0,00	149 550,95	31 405,70	180 956,65	38
9 Dodatek č.2	ZL č.8 - Vícepráce VO	0,00	69 018,00	14 493,78	83 511,78	17
9 Dodatek č.2	ZL č.8 - Méněpráce VO	0,00	-190 278,00	-39 958,38	-230 236,38	-48
Celkem za stavbu		0,00	395 115,91	82 974,34	478 090,25	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 273,92	3
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			51 060,00	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			79 750,01	20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 324,00	9
46	Zpevněné plochy	HSV			100 772,75	26
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 821,00	2
EL01	ELEKTROMONTÁŽE/ MATERIÁLY	HSV			34 656,00	9
EL04	ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPY	HSV			-58 500,00	-15
704	Oplocení	PSV			107 604,15	27
708	Záchytné sítě za brankami včetně nosné konstrukce	PSV			55 136,88	14
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			-97 416,00	-25
M077	Umělá závlaha	MON			60 000,00	15

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 633,20	1
Cena celkem					395 115,91	100

Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	30	ZL č.9 - Záchytné sítě za brankou u kabin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 273,92
1	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	7,92000	1 676,00	13 273,92
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*(0,8*1,1)*1,1)		7,92000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				79 750,01
2	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	15,12000	3 295,00	49 820,40
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*(2*(0,8+1,0)*1)*1,05		15,12000		
3	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	10,26000	649,00	6 658,74
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*(2*(0,8+1,1)*0,3)		10,26000		
4	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	10,26000	143,50	1 472,31
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*(2*(0,8+1,1)*0,3)		10,26000		
5	275353112R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m	kus	9,00000	475,00	4 275,00
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9		9,00000		
6	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,14580	51 480,00	7 505,78
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*(2*(0,8+1,0))*0,0045		0,14580		
7	278311042R00	Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého C 16/20, při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	1,18692	5 445,00	6 462,78
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*((3,14*0,2*0,2)*1)*1,05		1,18692		
8	95-01	D+M chránička PVC dn 200, patky záchytných sítí	ks	9,00000	395,00	3 555,00
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9		9,00000		
Díl: 704		Oplocení				107 604,15
9	338171123T0B	Osazení sloupků plot. ocelových, zabet. B 30 bez dodávky betonu a vrtání děr	kus	9,00000	350,00	3 150,00
		Záchytné sítě za brankami : 9		9,00000		
10	7770015TR04	Sloup záchytných sítí, žárově pozinkovaný tr. 89/4, vč. uchycení pro lanka a víčka,	Kg	524,79000	165,00	86 590,35
		Sloupy záchytných sítí 89/4 u tribuny : 9*7*8,33		524,79000		
11	777DIRICX-0260T	Vzpěra záchytných sítí 76/4 l=400-500cm bez ukončení	Kg	86,00000	165,00	14 190,00
		2*5*8,6		86,00000		
12	338171126T06	Osazení zavětrovacích prvků na oplocení	kus	2,00000	385,00	770,00
		Záchytné sítě : 2		2,00000		
13	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,95279	1 487,00	2 903,80
Díl: 708		Záchytné sítě za brankami včetně nosné konstrukce				55 136,88
14	705911123T07	Montáž PE ochranných sítí, za použití montážní plošiny	m	40,00000	355,00	14 200,00
		Záchytné sítě : 40		40,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	30	ZL č.9 - Záchytné sítě za brankou u kabin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	348401350	Osazení napínacího lanka sítí	m	160,00000	22,00	3 520,00
		Záchytné sítě (4 řady) : 4*40		160,00000		
16	348401360	Přiháčkování sítí k napínacímu lanku	m	160,00000	11,00	1 760,00
		Záchytné sítě (4 řady) : 4*40		160,00000		
17	703KV5001T	Napínák	ks	4,00000	68,00	272,00
		Záchytné sítě (4 řady) : 4		4,00000		
18	703KV50122T	Závěsné ocelové lanko obstříknuté v plastu 3/4 mm	m	82,40000	15,00	1 236,00
		Záchytné sítě (4 řady) : 2*40*1,03		82,40000		
19	703KV5016T	Svorka pro smyčku	ks	12,00000	9,00	108,00
		3*4		12,00000		
20	703KV50199T	Závěsné ocelové lanko obstříknuté v plastu 5/6 mm	m	82,40000	35,00	2 884,00
		Záchytné sítě dvě lanka horní a spodní : 2*40*1,03		82,40000		
21	703KV5033T	Závěsná karabinka na ochranné sítě	ks	400,00000	20,00	8 000,00
		Záchytné sítě (4 řady) : 2*40*5		400,00000		
22	703KV891010T	Závěsná síť PP oka 120x120mm-4mm-bílá,černá,zelená	m2	240,00000	95,00	22 800,00
		Záchytné sítě : 40*6		240,00000		
23	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,24000	1 487,00	356,88

Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	31	ZL č.10 - Teréni úpravy kolem hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				51 060,00
1	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	15,00000	1 204,00	18 060,00
		15		15,00000		
2	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	60,00000	550,00	33 000,00
		60		60,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	32	ZL č.11 - D+M čerpadlo závlahy ve studni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M077		Umělá závlaha				60 000,00
1	904 R00	Zapojení čerpadla do systému včetně kabeláže a potrubí do zásobníku 60 bm	kpl	1,00000	23 500,00	23 500,00
		1		1,00000		
2	Čerpadlo 1	D+M čerpadlo závlahy	ks	1,00000	36 500,00	36 500,00
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	33	ZL č.12 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				36 324,00
1	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	12,00000	1 587,00	19 044,00
		Palisádová stěna : 12		12,00000		
2	592284R01	Palisáda 18x12x80 cm, přírodní	kus	72,00000	240,00	17 280,00
		Palisádová stěna : 12*6		72,00000		
Díl: 46		Zpevněné plochy				100 772,75
3	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	101,00000	229,00	23 129,00
		chodník před tribunou : 40		40,00000		
		chodník před kabinama : 61		61,00000		
4	564801112V06	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, kamenivo frakce 4-8	m2	101,00000	62,00	6 262,00
		chodník před tribunou : 40		40,00000		
		chodník před kabinama : 61		61,00000		
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	101,00000	250,00	25 250,00
		chodník před tribunou : 40		40,00000		
		chodník před kabinama : 61		61,00000		
6	592451124R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní skladba	m2	106,05000	435,00	46 131,75
		chodník před tribunou : 40*1,05		42,00000		
		chodník před kabinama : 61*1,05		64,05000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 821,00
7	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	2,25000	3 476,00	7 821,00
		stávající plocha před vstupem do kabin : 15*0,15		2,25000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 633,20
8	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	4,95000	281,00	1 390,95
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,95000	217,00	1 074,15
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,50000	15,00	742,50
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,95000	288,00	1 425,60

Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	9 Dodatek č.2 ZL. č.8 - Méněpráce VO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: EL04		ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPY				-58 500,00
1	M21R026	Betonový základ vč. ocelové výztuže a montáž mimo osu kabelu 0,6x0,6x0,8m	ks	-13,00000	4 500,00	-58 500,00

-13

-13,00000

Díl: 741		Elektroinstalace - silnoprúd				-131 778,00
2	1010000034.13	Stožár 4m K4	kus	-13,00000	7 602,00	-98 826,00
3	1010000034.4	5-12K - VCS_GL02_1000_3K_3C, světelný tok 2926 lm, inst. příkon 27W - LED pro veřejné osvětlení s asymetrickou PMMA optikou C	kus	-3,00000	10 984,00	-32 952,00

-3

-3,00000


Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	9 Dodatek č.2 ZL č.8 - Vícepráce VO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: EL01		ELEKTROMONTÁŽE/ MATERIÁLY				34 656,00
1	M21R003	Trubka instalační oheb. Kopex r=50mm	m	200,00000	52,00	10 400,00
		200		200,00000		
2	M21R004	Pásek FeZn 30/4	m	100,00000	169,00	16 900,00
		100		100,00000		
3	M21R005	zemní drát do základu FezN 10mm	m	8,00000	163,00	1 304,00
		8*1		8,00000		
4	M21R006	Svorka Sr2B páska-páska	ks	12,00000	101,00	1 212,00
		12		12,00000		
5	M21R007	Svorka SR3B páska-drát	ks	8,00000	101,00	808,00
6	M21R008	Ukon.kabelu do 4x10 mm ²	ks	8,00000	504,00	4 032,00
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				34 362,00
7	741 R03	D+M CYKY J4x6 v zemi pro osvětlení	m	166,00000	207,00	34 362,00
		446-280		166,00000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 008

Předmět díla:	Vranovice - Sportoviště II		
Objekt:	SO03 Osvětlení		
Objednatel:	Obec Vranovice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Leoš Pekárek		
Projektant:	Projecticon, s.r.o.		
Popis změny: Úprava veřejného osvětlení Na základě požadavku investora, byla část VO upravena následujícím způsobem. Část svítidel (5 ks) byla osazena na stávající sloupy NN, Byl upraven počet svítidel a stožárů dle skutečnosti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota přípočtů (víceprací)		69 018,00 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		-190 278,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		-121 260,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-25 464,60 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		-146 724,60 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD v dodatku č.2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	31.7.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	2.8.2023	
	TDI:	2.8.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):	2.8.2023	
přílohy	Přílohy:		
	ZL č.8 - rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022-09-14 Vranovice - sportoviště II

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: 00283720

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-23 844,00
PSV			-97 416,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-121 260,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-121 260,00 CZK
Základní DPH	21 %	-25 464,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -146 724,60 CZK

v

OTNICE

dne

31. 7. 2023

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: 544210817, www.prostavby.eu

DIČ: CZ27713130 ②

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE

Školní 1

691 25 VRANOVICE

okr. Brno-venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vranovice - sportoviště II	0,00	-121 260,00	-25 464,60	-146 724,60	100
9 Dodatek č.2	ZL č.8 - Vícepráce VO	0,00	69 018,00	14 493,78	83 511,78	-57
9 Dodatek č.2	ZL č.8 - Méněpráce VO	0,00	-190 278,00	-39 958,38	-230 236,38	157
Celkem za stavbu		0,00	-121 260,00	-25 464,60	-146 724,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
EL01	ELEKTROMONTÁŽE/ MATERIÁLY	HSV			34 656,00	-29
EL04	ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPY	HSV			-58 500,00	48
741	Elektroinstalace - silnoprúd	PSV			-97 416,00	80
Cena celkem					-121 260,00	100

Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	9 Dodatek č.2 ZL. č.8 - Méněpráce VO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: EL04		ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPY				-58 500,00
1	M21R026	Betonový základ vč. ocelové výztuže a montáž mimo osu kabelu 0,6x0,6x0,8m	ks	-13,00000	4 500,00	-58 500,00

-13

-13,00000

Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				-131 778,00
2	1010000034.13	Stožár 4m K4	kus	-13,00000	7 602,00	-98 826,00
3	1010000034.4	5-12K - VCS_GL02_1000_3K_3C, světelný tok 2926 lm, inst. příkon 27W - LED pro veřejné osvětlení s asymetrickou PMMA optikou C	kus	-3,00000	10 984,00	-32 952,00

-3

-3,00000


Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	9 Dodatek č.2 ZL č.8 - Vícepráce VO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: EL01		ELEKTROMONTÁŽE/ MATERIÁLY				34 656,00
1	M21R003	Trubka instalační oheb. Kopex r=50mm	m	200,00000	52,00	10 400,00
		200		200,00000		
2	M21R004	Pásek FeZn 30/4	m	100,00000	169,00	16 900,00
		100		100,00000		
3	M21R005	zemnicí drát do základu FezN 10mm	m	8,00000	163,00	1 304,00
		8*1		8,00000		
4	M21R006	Svorka Sr2B páska-páska	ks	12,00000	101,00	1 212,00
		12		12,00000		
5	M21R007	Svorka SR3B páska-drát	ks	8,00000	101,00	808,00
6	M21R008	Ukon.kabelu do 4x10 mm2	ks	8,00000	504,00	4 032,00
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				34 362,00
7	741 R03	D+M CYKY J4x6 v zemi pro osvětlení	m	166,00000	207,00	34 362,00
		446-280		166,00000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 009

Předmět díla:	Vranovice - Sportoviště II		
Objekt:			
Objednatel:	Obec Vranovice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Leoš Pekárek		
Projektant:	Projecticon, s.r.o.		
Popis změny: Záchytné sítě Na základě požadavku investora doplněna záchytná síť na straně u kabin.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota přípočtů (víceprací)		255 764,96 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		255 764,96 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	53 710,64 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		309 475,60 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu stavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.2
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	31.7.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	2.8.2023	
	TDI:	2.8.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):	2.8.2023	
přílohy	Přílohy: ZL č.9 - rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022-09-14 Vranovice - sportoviště II

Objekt: 01 Vranovice - sportoviště II

Rozpočet: 30 ZL č.9 - Záchytné sítě za brankou u kabin

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: 00283720

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			93 023,93
PSV			162 741,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			255 764,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	255 764,96 CZK
Základní DPH	21 %	53 710,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **309 475,60 CZK**

v OTNICÍCH

dne 31. 7. 2023

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544219817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130 ②

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 273,92	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			79 750,01	31
704	Oplocení	PSV			107 604,15	42
708	Záchytné sítě za brankami včetně nosné konstrukce	PSV			55 136,88	22
Cena celkem					255 764,96	100

Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	30	ZL č.9 - Záchytné sítě za brankou u kabin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 273,92
1	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	7,92000	1 676,00	13 273,92
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*(0,8*1,1)*1,1)		7,92000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				79 750,01
2	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	15,12000	3 295,00	49 820,40
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*(2*(0,8*1,0)*1)*1,05		15,12000		
3	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	10,26000	649,00	6 658,74
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*(2*(0,8+1,1)*0,3)		10,26000		
4	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	10,26000	143,50	1 472,31
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*(2*(0,8+1,1)*0,3)		10,26000		
5	275353112R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m	kus	9,00000	475,00	4 275,00
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9		9,00000		
6	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,14580	51 480,00	7 505,78
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*(2*(0,8+1,0))*0,0045		0,14580		
7	278311042R00	Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého C 16/20, při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	1,18692	5 445,00	6 462,78
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9*((3,14*0,2*0,2)*1)*1,05		1,18692		
8	95-01	D+M chránička PVC dn 200, patky záchytných sítí	ks	9,00000	395,00	3 555,00
		Základy pro sloupky záchytných sítí :				
		u kabin : 9		9,00000		
Díl: 704		Oplocení				107 604,15
9	338171123T0B	Osazení sloupků plot. ocelových, zabet. B 30 bez dodávky betonu a vrtání děr	kus	9,00000	350,00	3 150,00
		Záchytné sítě za brankami : 9		9,00000		
10	7770015TR04	Sloup záchytných sítí, žárově pozinkovaný tr. 89/4, vč. uchycení pro lanka a víčka,	Kg	524,79000	165,00	86 590,35
		Sloupy záchytných sítí 89/4 u tribuny : 9*7*8,33		524,79000		
11	777DIRICX-0260T	Vzpěra záchytných sítí 76/4 l=400-500cm bez ukončení	Kg	86,00000	165,00	14 190,00
		2*5*8,6		86,00000		
12	338171126T06	Osazení zavětrovacích prvků na oplocení	kus	2,00000	385,00	770,00
		Záchytné sítě : 2		2,00000		
13	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,95279	1 487,00	2 903,80
Díl: 708		Záchytné sítě za brankami včetně nosné konstrukce				55 136,88
14	705911123T07	Montáž PE ochranných sítí, za použití montážní plošiny	m	40,00000	355,00	14 200,00
		Záchytné sítě : 40		40,00000		


Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	30	ZL č.9 - Záchytné sítě za brankou u kabin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	348401350	Osazení napínacího lanka sítí	m	160,00000	22,00	3 520,00
		Záchytné sítě (4 řady) : 4*40		160,00000		
16	348401360	Přiháčkování sítí k napínacímu lanku	m	160,00000	11,00	1 760,00
		Záchytné sítě (4 řady) : 4*40		160,00000		
17	703KV5001T	Napínák	ks	4,00000	68,00	272,00
		Záchytné sítě (4 řady) : 4		4,00000		
18	703KV50122T	Závěsné ocelové lanko obstříknuté v plastu 3/4 mm	m	82,40000	15,00	1 236,00
		Záchytné sítě (4 řady) : 2*40*1,03		82,40000		
19	703KV5016T	Svorka pro smyčku	ks	12,00000	9,00	108,00
		3*4		12,00000		
20	703KV50199T	Závěsné ocelové lanko obstříknuté v plastu 5/6 mm	m	82,40000	35,00	2 884,00
		Záchytné sítě dvě lanka horní a spodní : 2*40*1,03		82,40000		
21	703KV5033T	Závěsná karabinka na ochranné sítě	ks	400,00000	20,00	8 000,00
		Záchytné sítě (4 řady) : 2*40*5		400,00000		
22	703KV891010T	Závěsná síť PP oka 120x120mm-4mm-bílá, černá, zelená	m2	240,00000	95,00	22 800,00
		Záchytné sítě : 40*6		240,00000		
23	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,24000	1 487,00	356,88

Protokol o změně díla

Změnový list č. 010

Předmět díla:	Vranovice - Sportoviště II		
Objekt:	SO06 Tenis, SO07 Běžecká dráha		
Objednatel:	Obec Vranovice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dédina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Leoš Pekárek		
Projektant:	Projecticon, s.r.o.		
Popis změny: Teréni úpravy Po osazení Běžecké dráhy a tenisové hřiště je nutné dopravit terén kolem těchto sportovišť a to navezením zeminy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (víceprací)		51 060,00 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		51 060,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	10 722,60 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		61 782,60 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD v dodatku č.2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	31.7.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	2.8.2023	
	TDI:	2.8.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):	2.8.2023	
přílohy	Přílohy: ZL č.10 - rozpočet		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2022-09-14 Vranovice - sportoviště II	
Objekt:	01	Vranovice - sportoviště II	
Rozpočet:	31	ZL č.10 - Teréní úpravy kolem hřiště	
Objednatel:	Obec Vranovice	IČO: 00283720	
	Školní 1	DIČ:	
	69125 Vranovice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY,a.s.	IČO: 27713130	
	Dědina 447	DIČ: CZ27713130	
	68354 Otnice		
Vypracoval:	Ing. Janský		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			51 060,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 060,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		51 060,00 CZK
Základní DPH	21 %		10 722,60 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			61 782,60 CZK
v OTNICECH PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 OTNICE Tel.: 544210817 www.prostavby.eu DIČ: CZ27713130 ② dne 31.7.2023 Za zhotovitele OBEC VRANOVICE Školní 1 691 25 VRANOVICE okr. Brno-venkov Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			51 060,00	100
Cena celkem					51 060,00	100

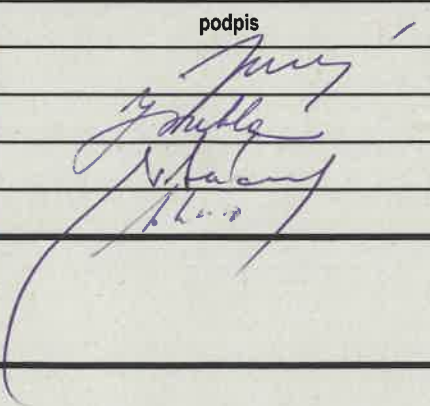
Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	31	ZL č.10 - Teréní úpravy kolem hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				51 060,00
1	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	15,00000	1 204,00	18 060,00
		15		15,00000		
2	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	60,00000	550,00	33 000,00
		60		60,00000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 011

Předmět díla:	Vranovice - Sportoviště II		
Objekt:			
Objednatel:	Obec Vranovice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Leoš Pekárek		
Projektant:	Projecticon, s.r.o.		
Popis změny: D+M Čerpadlo závlahy Při montáži závlahového systému, bylo zjištěno, že stávající čerpadlo již není ve vyhovujícím stavu a je nutné ho vyměnit za nové.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	x
údaje o složení ceny změny	Hodnota přípočtů (víceprací)		60 000,00 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		60 000,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	12 600,00 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		72 600,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD v dodatku č.2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	31.7.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	2.8.2023	
	TDI:	2.8.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):	2.8.2023	
přílohy	Přílohy:		
	ZL č.11 - rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022-09-14 Vranovice - sportoviště II

Objekt: 01 Vranovice - sportoviště II

Rozpočet: 32 ZL č.11 - D+M čerpadlo závlahy ve studni

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: 00283720

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			60 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 600,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

72 600,00 CZK

v

OTNICE

dne

31.7.2023

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447 683 54 OTNICE

Tel.: 544210817, www.prostavby.eu

DIČ: CZ27713130 ②

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE

Školní 1

691 25 VRANOVICE

okr. Brno-venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M077	Umělá zavlaha	MON			60 000,00	100
Cena celkem					60 000,00	100


Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	32	ZL č.11 - D+M čerpadlo závlahy ve studni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M077		Umělá závlaha				60 000,00
1	904 R00	Zapojení čerpadla do systému včetně kabeláže a potrubí do zásobníku 60 bm	kpl	1,00000	23 500,00	23 500,00
		1		1,00000		
2	Čerpadlo 1	D+M čerpadlo závlahy	ks	1,00000	36 500,00	36 500,00
		1		1,00000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 012

Předmět díla:	Vranovice - Sportoviště II		
Objekt:			
Objednatel:	Obec Vranovice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Leoš Pekárek		
Projektant:	Projecticon, s.r.o.		
Popis změny: Zpevněné plochy V rámci stavby bylo nutné upravit a doplnit stávající zpevněné plochy a to při vstupu do kabin a před stávající tribunou.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		x
údaje o složení ceny změny	Hodnota přípočtů (víceprací)		149 550,95 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		149 550,95 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	31 405,70 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		180 956,65 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu stavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.2
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	31.7.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	2.8.2023	
	TDI:	2.8.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):	2.8.2023	
přílohy	Přílohy: ZL č. 12 - rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022-09-14 Vranovice - sportoviště II		
Objekt:	01	Vranovice - sportoviště II	
Rozpočet:	33	ZL č.12 - Zpevněné plochy	
Objednatel:	Obec Vranovice Školní 1 69125 Vranovice		IČO: 00283720 DIČ:
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 68354 Otnice		IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130
Vypracoval:	Ing. Janský		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				149 550,95
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				149 550,95

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		149 550,95 CZK
Základní DPH	21 %		31 405,70 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			180 956,65 CZK

v OTNICECH dne 31.7.2023

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130 ②

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 324,00	24
46	Zpevněné plochy	HSV			100 772,75	67
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 821,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 633,20	3
Cena celkem					149 550,95	100

Položkový rozpočet

S:	2022-09-14	Vranovice - sportoviště II
O:	01	Vranovice - sportoviště II
R:	33	ZL č. 12 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				36 324,00
1	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	12,00000	1 587,00	19 044,00
		Palisádová stěna : 12		12,00000		
2	592284R01	Palisáda 18x12x80 cm, přírodní	kus	72,00000	240,00	17 280,00
		Palisádová stěna : 12*6		72,00000		
Díl: 46		Zpevněné plochy				100 772,75
3	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	101,00000	229,00	23 129,00
		chodník před tribunou : 40		40,00000		
		chodník před kabinama : 61		61,00000		
4	564801112V06	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, kamenivo frakce 4-8	m2	101,00000	62,00	6 262,00
		chodník před tribunou : 40		40,00000		
		chodník před kabinama : 61		61,00000		
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	101,00000	250,00	25 250,00
		chodník před tribunou : 40		40,00000		
		chodník před kabinama : 61		61,00000		
6	592451124R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní skladba	m2	106,05000	435,00	46 131,75
		chodník před tribunou : 40*1,05		42,00000		
		chodník před kabinama : 61*1,05		64,05000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 821,00
7	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	2,25000	3 476,00	7 821,00
		stávající plocha před vstupem do kabin : 15*0,15		2,25000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 633,20
8	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	4,95000	281,00	1 390,95
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,95000	217,00	1 074,15
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,50000	15,00	742,50
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,95000	288,00	1 425,60

